


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	17 feb '25									
									V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1			Compra y Venta	32 días	lun 17/2/25	mar 1/4/25		LuisFer_Dev										
2			Modelamiento de BD	1 día	lun 17/2/25	lun 17/2/25		LuisFer_Dev										
3			Migraciones	1 día	mar 18/2/25	mar 18/2/25	2	LuisFer_Dev										
4			Modelos	1 día	mié 19/2/25	mié 19/2/25	3	LuisFer_Dev										
5			Controladores	8 días	jue 20/2/25	lun 3/3/25		LuisFer_Dev										
6			Usuario	0,5 días	jue 20/2/25	jue 20/2/25	4	LuisFer_Dev										
7			Categoría	0,5 días	jue 20/2/25	jue 20/2/25	6	LuisFer_Dev										
8			Producto	1 día	vie 21/2/25	vie 21/2/25	7	LuisFer_Dev										
9			Proveedores	1 día	lun 24/2/25	lun 24/2/25	8	LuisFer_Dev										
10			Clientes	1 día	mar 25/2/25	mar 25/2/25	9	LuisFer_Dev										
11			Compra	2 días	mié 26/2/25	jue 27/2/25	10	LuisFer_Dev										
12			Venta	2 días	vie 28/2/25	lun 3/3/25	11	LuisFer_Dev										
13			Vistas	17 días	mar 4/3/25	mié 26/3/25		LuisFer_Dev										
14			Mant. Usuario	1 día	mar 4/3/25	mar 4/3/25	12	LuisFer_Dev										
15			Mant. Categoría	1 día	mié 5/3/25	mié 5/3/25	14	LuisFer_Dev										
16			Mant. Producto	1 día	jue 6/3/25	jue 6/3/25	15	LuisFer_Dev										
17			Mant. Proveedor	1 día	vie 7/3/25	vie 7/3/25	16	LuisFer_Dev										
18			Mant. Cliente	1 día	lun 10/3/25	lun 10/3/25	17	LuisFer_Dev										
19			Listado de Compras	1,5 días	mar 11/3/25	mié 12/3/25	18	LuisFer_Dev										
20			Listado de Ventas	1,5 días	mié 12/3/25	jue 13/3/25	19	LuisFer_Dev										
21			Nueva Compra	1,5 días	vie 14/3/25	lun 17/3/25	20	LuisFer_Dev										
22			Nueva Venta	1,5 días	lun 17/3/25	mar 18/3/25	21	LuisFer_Dev										

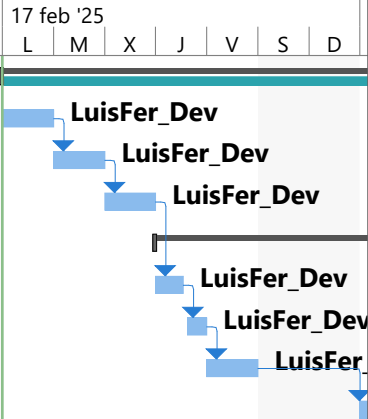

Proyecto: Gantt_v1
Fecha: lun 17/2/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo




















Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	17 feb '25													
									V	S	D	L	M	X	J	V	S	D				
23			Listado de Inventario	2 días	mié 19/3/25	jue 20/3/25	22	LuisFer_Dev														
24			Listado de Transacciones	2 días	vie 21/3/25	lun 24/3/25	23	LuisFer_Dev														
25			Dashboard	2 días	mar 25/3/25	mié 26/3/25	24	LuisFer_Dev														
26			Pruebas	3 días	jue 27/3/25	lun 31/3/25	25	LuisFer_Dev														
27			Producción	1 día	mar 1/4/25	mar 1/4/25	26	LuisFer_Dev														

Proyecto: Gantt_v1
Fecha: lun 17/2/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

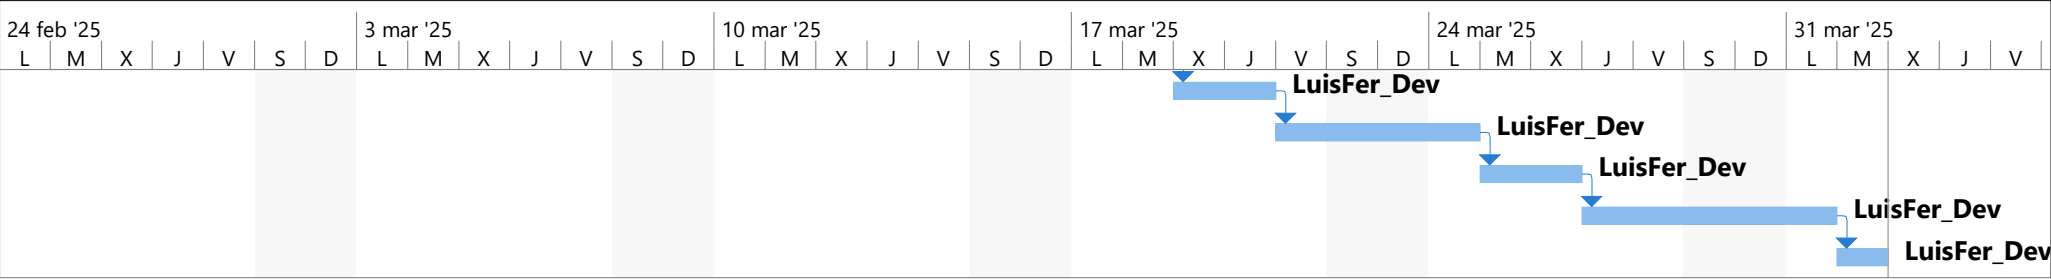

Proyecto: Gantt_v1
Fecha: lun 17/2/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
